


臺北縣瑞芳鎮北37線延長工程 (瑞慶橋至基隆暖暖區)

壹、計畫緣起

- 爲了推動文化生態旅遊，並同時推動地區產業發展，縣政府於民國84年開始對金九地區進行「商圈更新再造計畫」，瑞芳鎮於假日時湧入大量之旅遊人潮對現有交通的衝擊，其中臺2丁線(瑞芳至四腳亭)塞車問題嚴重。
- 民國87年省長視察瑞芳地區建設時，瑞芳鎮長建議於四角亭外環道及瑞八公路(臺2丁線)間興建北37線延伸道路作爲臺2丁線替代道路。

工程位置圖

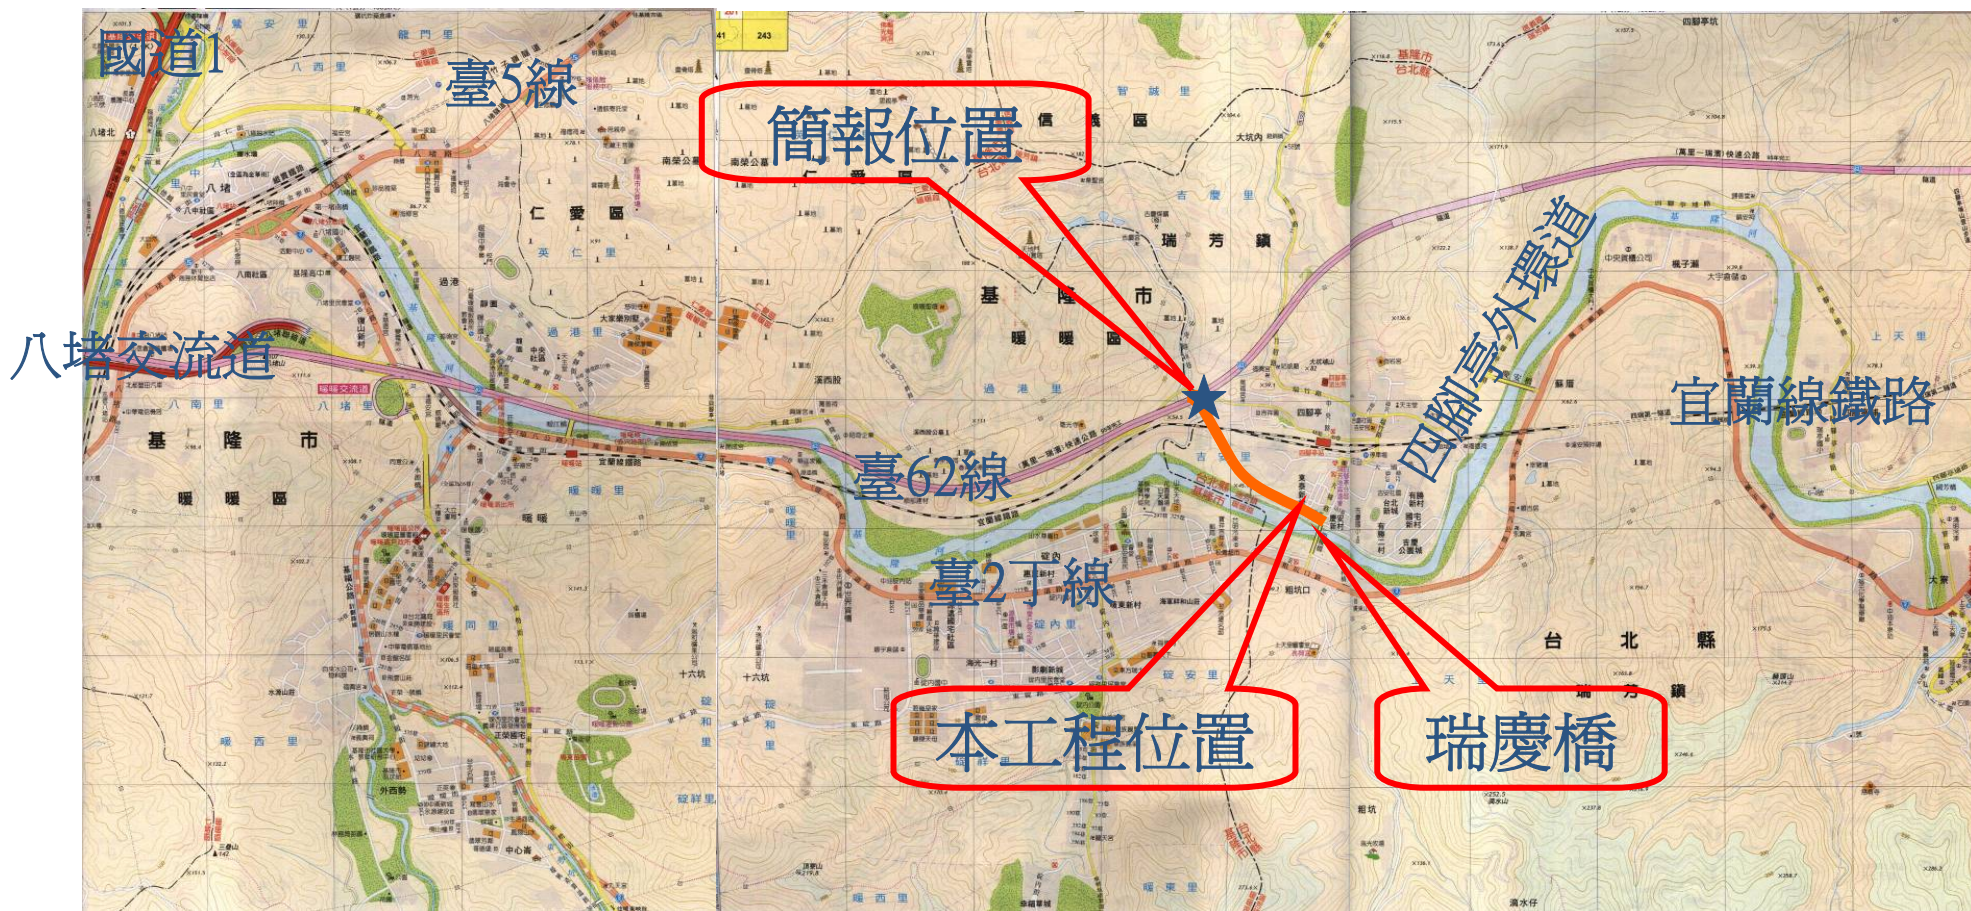

貳、工程經費

- 工程費2.5億元(前省府公路局補助1.35億元，本府補助1.15億元)
 - 第一期工程費用136,235,218元
 - 第二期工程費用112,477,854元
- 用地費2,854萬9,000元(本府補助1,756萬3,000元，瑞芳鎮公所自籌1,098萬6,000元)

參、施工期程

- 第一期工程於94年9月30日開工，95年9月6日完工
- 第二期工程於95年10月11日動工施作，預計96年8月9日完工

肆、辦理情形(至96.04.11日止)

- 預定進度：75.018%，實際進度：80.162%
- 已完成橋樑下部結構、預力樑等工項
- 橋面板、排水溝、紐澤西護欄、擋土設施等工項仍持續施作
