



「三峽隆恩埔原住民族文化部落新建工程」

工程簡報



主辦單位：台北縣政府 城鄉局
委辦單位：台北縣政府 原民局

臺北縣政府住宅及城鄉發展局



一. 計畫緣起

1. 本計畫第一期工程原始規劃構想係以興建出租住宅為主，惟為兼顧全縣4萬原住民族之需求，經縝密評估於二期工程擬增設大型室內聚會所、會議廳(餐廳)、雙語托兒所、原住民手工藝品展售中心、職訓研習教室、原住民族假日展演等之多功能綜合大樓。


2. 本案由行政院原住民族委員會逐年補助並配合縣府自籌工程經費，設置出租住宅及多功能綜合大樓，冀期提供多元居住計畫、原住民族技藝研習與週邊整體開放空間規劃(民族文化公園)，藉以提升都會原住民族生活技能培訓、展演及原住民傳承文化活力再現。冀期多元族群文化的開放空間規劃結合鶯歌陶博館、三峽老街、台北大學生活圈建構三鶯新文化采風特色與觀光遊憩景點，其願景可期。





二. 整體規劃

國有土地撥用應與文化局協調共構「民族文化公園」2.5公頃用地，建構六星計畫都會原住民族文化部落，一期工程施工中，二期工程將逐年編列預算。

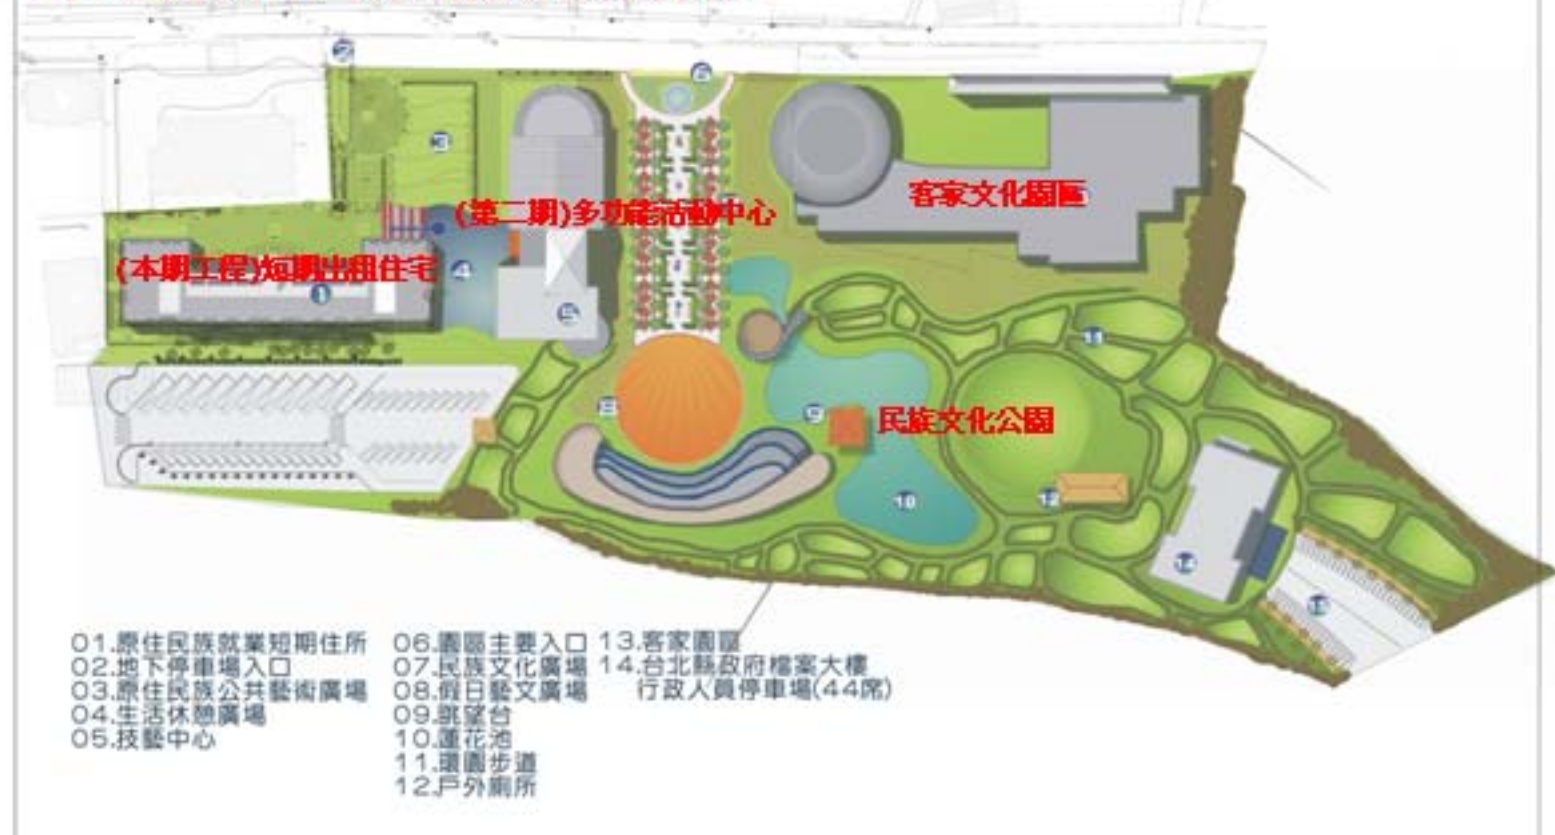

三峽隆恩埔原住民族文化部落新建工程--民族文化公園

<< 整體規劃 >>



三. 設計原則與構想

「三峽原住民族文化部落」以台灣原住民族建築，最能代表說明原住民適應環境能力，以來自山林的子民匯集在三峽文化部落裡，一方面可以融入新世紀都會挑戰，另一方面回溯到山林的懷抱；本案將原住民族「文化」融入「安置住所及多功能綜合活動中心大樓」中，作為原住民族「社群」生活的重現。建築型態意匠與語彙色彩則引用象徵來自原住民樸實無華的原鄉原味的美感，展現了原住民族文化傳承與智慧。





「三峽隆恩埔原住民族部落新建工程」

空間造型設計

三. 設計原則與構想



透視圖



北向立面圖(隆恩街)



南向立面圖(高速公路)



四. 預期營運與願景

本計畫營運管理目標為：

- 一、提供原住民短期居住空間，解決原住民居住問題
- 二、提供原住民族就業技藝研習以及輔導原住民就業
- 三、原民會正研議〈以租代售〉法令，將可解決長期原住民安置問題。

本計畫之預期效益與未來願景：

- (一) 提供原住民族優質良好的技藝研習空間。
- (二) 重現原住民族文化，以尊重族群發展傳承文化精髓。
- (三) 傳承原住民族文化技藝，培訓研習特殊專長。
- (四) 作為台北縣原住民族永續經營傳承文化中心及「全國示範原民文化」技藝中心。
- (五) 串連三峽、鶯歌周邊文化街廓區帶活動。





五. 目前工程執行概況

- (一)原開工日期94/04/27，工期為550天，原預定於95/10/29完工。
- (二)第一次展延工期81日曆天(土方無法外運75天+天然因素6天)，展延至96/01/18完工。
- (三)第一次變更設計，因有五大管線、周邊景觀、數量不足、項目漏列、簡易家具、圍牆及配合原民局需求等辦理變更設計及展延工期99日曆天，展延至96/04/27完工。
- (四)工程進度：預定進度96.70%、實際進度92%，尚落後4.70%。
- (五)目前尚待趕工項目：
- 1.主體工程室內部份為：
(1)電梯間花崗石牆面及地坪、(2)樓梯間欄杆及橡膠地坪
(3)各樓層走廊地磚、(4)三樓採光罩、北側造型柱洗石子
(5)簡易家具(廚具與陶薄板)、(6)室外油漆粉刷
 - 2.室外景觀目前只完成水溝及驗苗等；鍛造大門、圍牆欄杆、石材鋪面、枕木步道及植栽施作中。
- (六)原住民進駐期程：96年8月底。



六. 二期預算編列

- (一)「三峽隆恩埔原住民族文化部落」本期工程總計3億6百萬元(由行政院原民會補助2億3千7百萬元，縣府自籌6千9百萬元)。
- (二)未來第二期多功能綜合大樓新建工程預算編列應依「九十五年度中央政府總預算編製作業手冊共同性費編列標準表」編列，為配合「民族文化公園」共塑整體發展願景，二期工程費用約需300,000,000元，請原民局再積極向中央爭取。
- (三)二期工程預計工期約為二年，如順遂預計九十九年底可完成。
