

萬里鄉野柳村東澳路拓寬改善工程

簡報內容

- ❖ 計畫緣起
- ❖ 計畫內容
- ❖ 計畫經費
- ❖ 計畫期程
- ❖ 辦理情形

萬里鄉野柳村東澳路拓寬改善工程

❖ 計畫緣起

- 本案原係考量配合東澳漁港整體擴建計畫辦理，路線規劃係在「東澳漁港整體規劃」架構下進行，惟目前漁港整建計畫除有自然環境影響需再檢討外，經費問題尚未解決，經本府農業局評估，短期內無法辦理漁港擴建；有鑑於此，本道路規劃設計應跳脫原「東澳漁港整體規劃」架構，重新規劃較適合現況路線。東澳路計畫道路寬度為10公尺，目前東澳漁港段前後側僅為4公尺，僅可供小型車通行，部份僅能單向行駛，形成瓶頸路段，更影響遊客前來野柳風景區之行車安全。

❖ 計畫內容

- 將本漁港面臨海岸線之道路依10公尺路寬開闢，全長395公尺，寬度10公尺。

❖ 計畫經費


- 用地及拆遷費約1400萬元。工程費約4000萬元。

❖ 計畫期程

- 估計施工期程約7個月

❖ 辦理情形

- 於95.3.31及95.4.26舉辦地方說明會，在與會人員均表支持本規劃方案後，並請顧問公司辦理後續設計。
- 95.10.31基本設計完成，96.3.19完成鑽探，預計96.6.30完成細部設計。

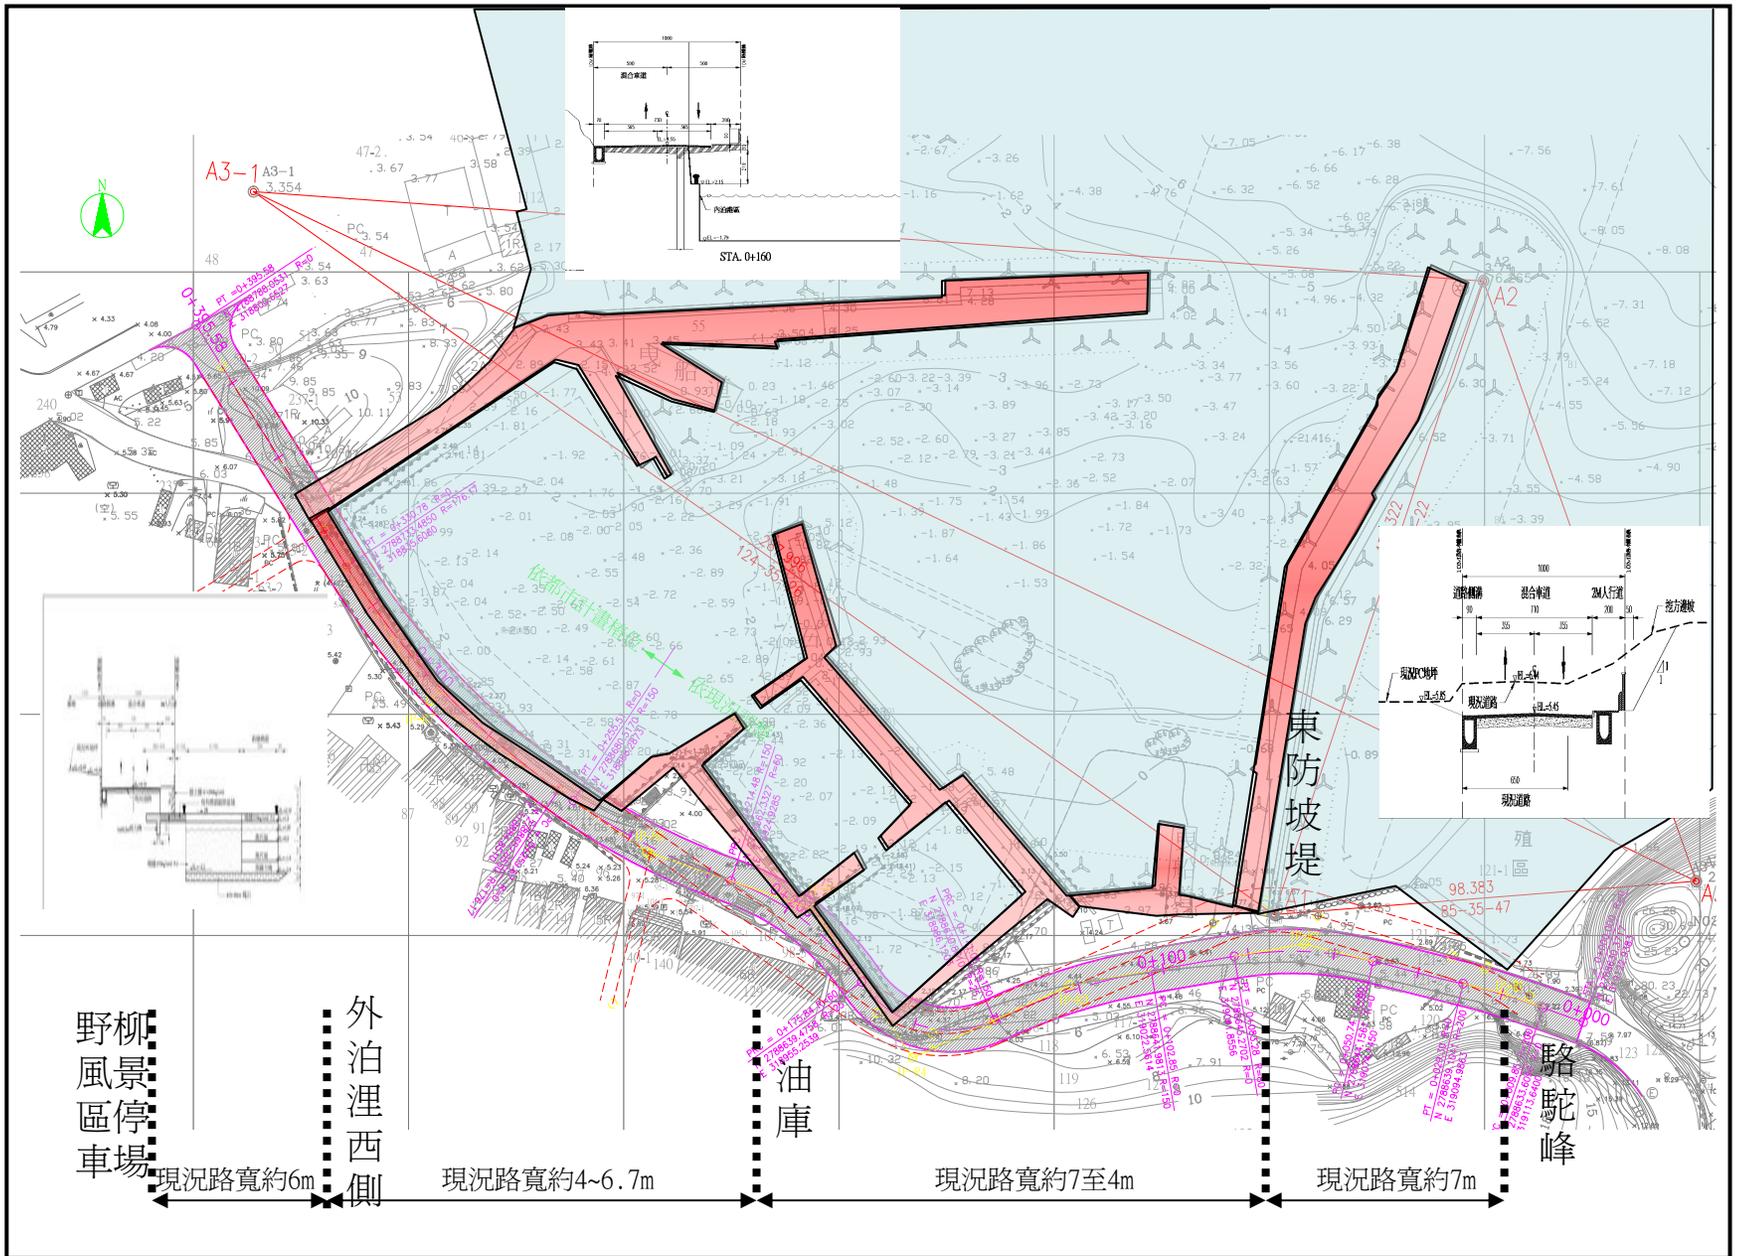

平面位置圖與斷面圖

現況說明

